



ACA vzw – Erkend controle-organisme
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
BE 0811407 869 / TEL: 051/200 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be

Referentie:
Datum controle:
Agent-bezoeker:
Besluit:

2020052897
25/06/2020
Sven Soete
CONFORM



ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 08/09/2019)

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: DomiTel Dries Vander Meulen, Engelstraat 23, 8540 DEERLIJK
Eigenaar: ARNAERT BERT
Installateur: DRIES VANDER MEULEN
BTW-nummer: BE 0507 917 734

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats controle: Brugsesteenweg 31, 8531 HULSTE
EAN-code installatie: 541 449 611 000 727 274
Tarief teller(s): Dubbeluur
Nummer teller(s): 84890035 99
Index teller(s): 28522 / 65454
Type installatie: Wooneenheid
Private HS-cabine: Neen
DNB: Fluvius
Type lokaal: Woning

Aard van de controle:

Overeenkomstig de voorschriften van Boek 1 – Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning – Interne procedure QPRO/ELE/001

Type controle: Controlebezoek (6.5.)
Datum uitvoering: ☐ Vóór 01/10/1981 ☒ Na 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☐ Na 01/06/2020
Nota's: Zie rubriek 'VASTSTELLINGEN: Opmerkingen'
Afwijkingen (Deel 8): Toegepast
Herkeuring op verslag: ACA 2017 07 1196

Algemene gegevens van de elektrische installatie:

Nominale spanning: 3 x 230 V Max. nominale stroom: 40 A Nominale waarde aansluitautomaat: 32 A
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² Type: XVB Type aardverbindingssysteem: TT
Aardelektrode: Aardingspen Sectie aardelektrode:
Sectie aardgeleider: 16 mm²
Aantal borden: 3 Aantal stroombanen: 22 + 3 + 3 Aantal reservekringen: 0 + 1 + 0
Gedecentraliseerde productie-installatie: Aanwezig AC-Vermogen (maximaal): 5,5 kVA
☒ PV-installatie ☐ Batterij-opslag ☐ Waterstofcentrale ☐ Warmte-kracht-koppeling ☐ Windmolen

Algemene beschrijving van de differentieelstroominrichtingen:

Hoofddifferentieelstroominrichting(en): ☐ Niet aanwezig
Nominale stroom I_n: 40 A Gevoeligheid ΔI: 300 mA Aantal polen: 4 Type: A
Extra: /
Bijkomende differentieelstroominrichting(en): ☐ Aanwezig, doch buiten de scope van deze controle ☐ Niet aanwezig
Nominale stroom I_n: 63 A Gevoeligheid ΔI: 30 mA Aantal polen: 4 Type: A
Extra: /

Schema's en plannen van de installatie:

Eendraads- of stroombaanschema(s):	Versie/nr.: 1	Datum: 25/06/2020	☒ In orde	☐ Niet aanwezig
Situatieplan(nen):	Versie/nr.: 1	Datum: 25/06/2020	☒ In orde	☐ Niet aanwezig
Situatieplan(nen) van de aardverbindingen:	Versie/nr.:	Datum:	☒ Niet van toepassing	☐ Niet aanwezig
Document(en) uitwendige invloeden:	Versie/nr.:	Datum:	☒ Niet van toepassing	☐ Niet aanwezig
Document(en) van de veiligheidsinstallaties:	Versie/nr.:	Datum:	☒ Niet van toepassing	☐ Niet aanwezig
Document(en) van de kritische installaties:	Versie/nr.:	Datum:	☒ Niet van toepassing	☐ Niet aanwezig

Metingen, controles en beproevingen:

Spreadingsweerstand aardverbinding:	24,3	Ohm	Meetmethode:	RE
Algemene isolatieweerstand:	7,1	MOhm	Meetspanning:	500V
Test differentieelstroominrichting(en):	Testknop:	OK	Foutflus:	OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders:	Algemeen:	OK	Equipotentiale verbinding:	OK
Bescherming onrechtstreekse aanraking:	OK		Bescherming rechtstreekse aanraking:	OK
Staat van het vast (opgesteld) materiaal:	OK		Staat van het verplaatsbaar materieel:	/

Dit verslag mag enkel in zijn geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid worden. In zijn digitale vorm geldt dit rapport als origineel exemplaar.

Referentie: 2020052897

Uitgiftedatum verslag: 25/06/20

Beschrijving van de stroombanen:

ID Bord	Differentieel- stroominrichting	Type beveiliging	Nominale stroom	Aantal polen	Sectie geleiders	Aantal	Reserve?
							☐

ZIE SCHEMA

VASTSTELLINGEN: Inbreuken**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- Geen inbreuken.
- De schema's van de elektrische installatie moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
- De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring.
- De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- De eenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.

BESLUIT:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: **25 jaar vanaf de datum van controle**

☐ Door hetzelfde organisme ☒ Door een organisme naar keuze

- ☒ De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
- ☒ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.
 - ☐ Tijdens een vorig plaatsbezoek
 - ☒ Tijdens huidig plaatsbezoek
- ☐ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.
- ☐ De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.
- ☐ Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- ☐ De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd.

Namens de technisch verantwoordelijke, de agent-bezoeker:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

De reglementaire voorschriften:

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die het mag raadplegen. Een kopie van dit dossier wordt ter beschikking gesteld van elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen.

Elke wijziging aan de elektrische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname. Deze controle wordt uitgevoerd door een erkend organisme.


De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

De plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installaties zijn raadpleegbaar op de website van ACA vzw (www.acavzw.be).

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard door het erkend organisme. Het verslag wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen.

Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.


Stappenplan in geval van een conforme elektrische installatie:



Dit verslag mag enkel in zijn geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid worden. In zijn digitale vorm geldt dit rapport als origineel exemplaar.

Referentie: 2020052897

Uitgiftedatum verslag: 25/06/20

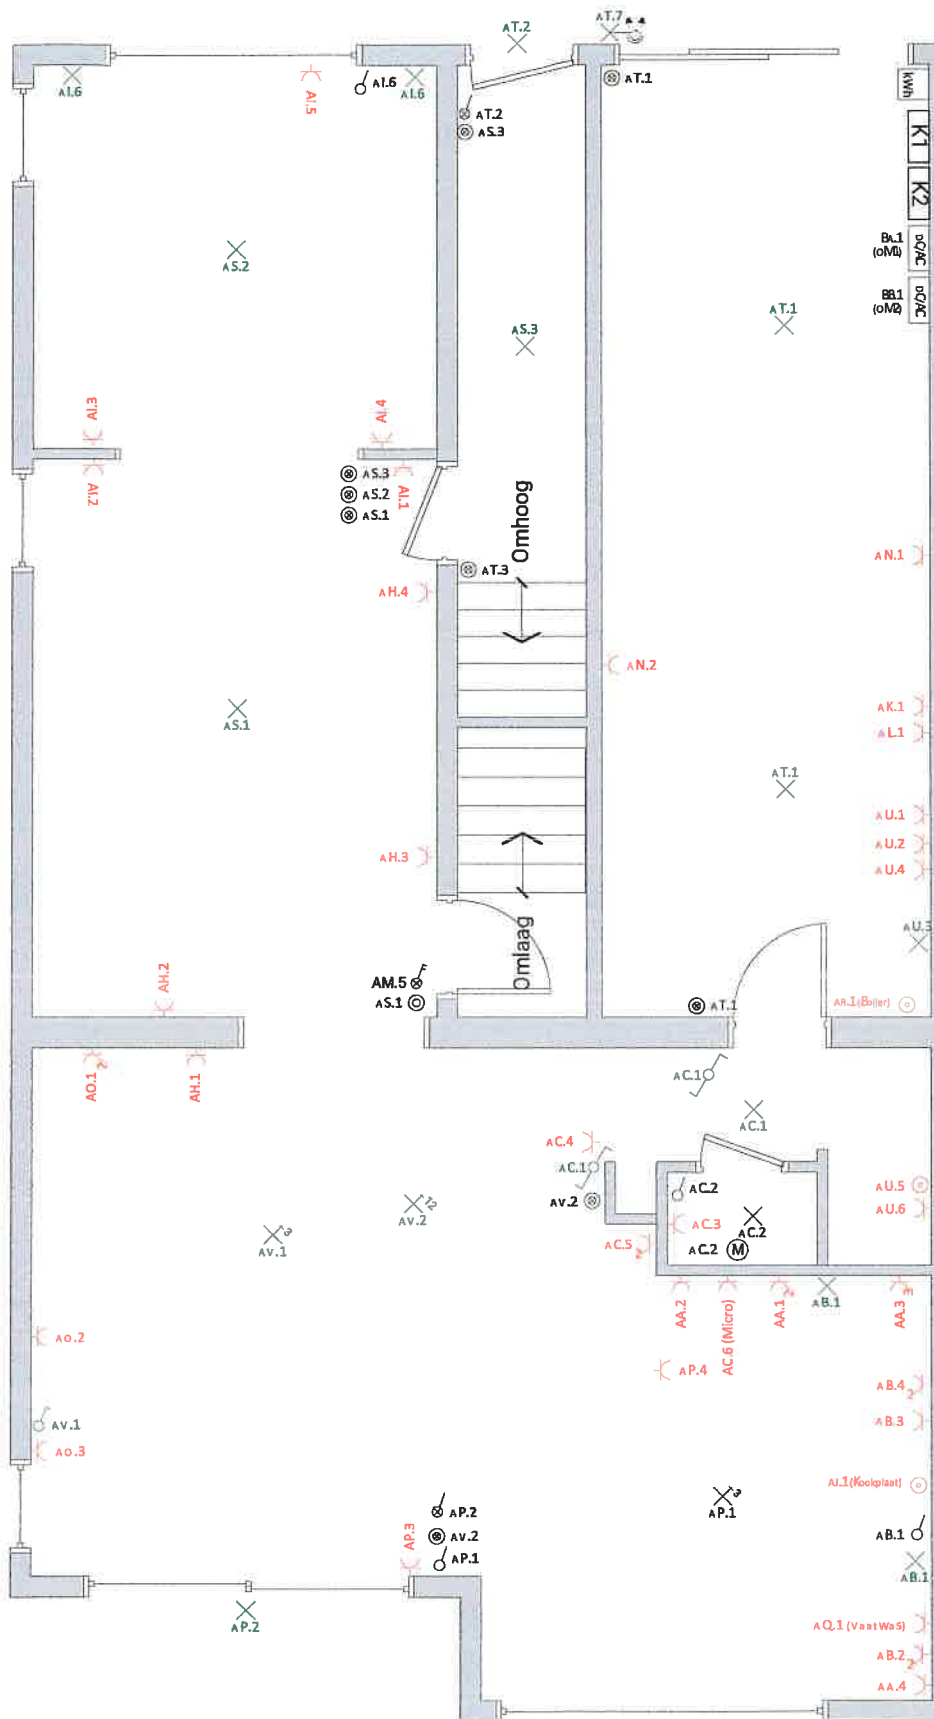

Bouwheer/Installateur:
 Naam Installateur:
 Dries Vander Meulen – Dorn/Tel
 Engelstraat 23, 8540 Deerlijk
 BTW nr: BE-0507.917.734
 Datum: .../.../2020


Handtekening:

Goedkeuringsorganisme
 Naam:
 Datum: .../.../2020

Handtekening:


Bouwheer
 Naam Installateur:
 Amaert Bert
 Bruggesteeweg 31
 8531 Hulste
 Datum: .../.../2020

Handtekening:

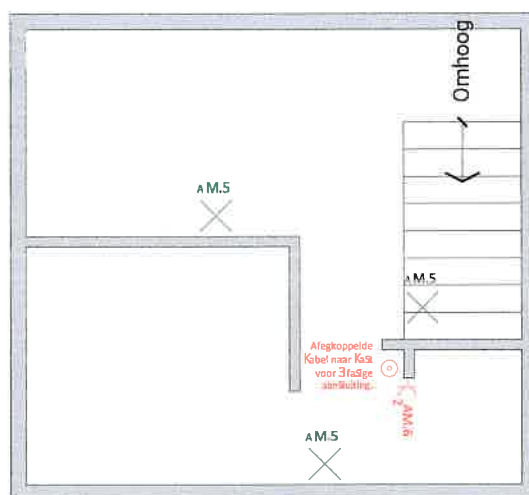

Teller EAN: 541449611000727274

Bouwheer/Installateur Naam Installateur: Dries Vander Meulen – DomTel Engelstraat 23, 8540 Deerlijk BTW nr: BE-0507.917.734 Datum: .../.../2020	Handtekening:	Goedkeuringsorganisme Naam: Goedkeuring: Datum: .../.../2020	Handtekening:	Bouwheer Naam Installateur: Arnaert Bert Brugsesteenweg 31 8531 Hulste Datum: .../.../2020	Handtekening:
---	----------------------	--	----------------------	--	----------------------

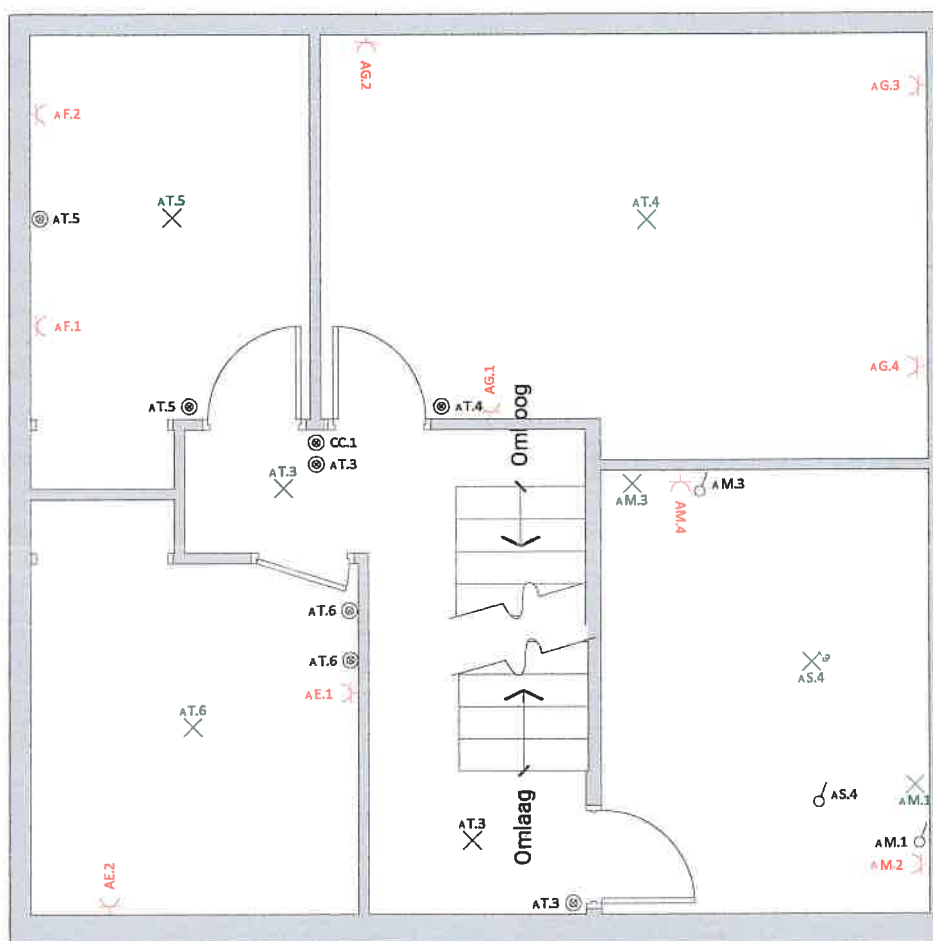

Bouwheer/Installateur:
 Naam Installateur:
 Dries Vander Meulen – Dom/Tel
 Engelstraat 23, 8540 Deerlijk
 BTW nr: BE-0507.917.734
 Datum: .../.../2020


Handtekening:

Goedkeuringsorganisme
 Naam:
 Datum: .../.../2020


Handtekening:

Bouwheer
 Naam Installateur:
 Amaert Bert
 Bruggesteenvweg 31
 8531 Hulste
 Datum: .../.../2020

Handtekening:

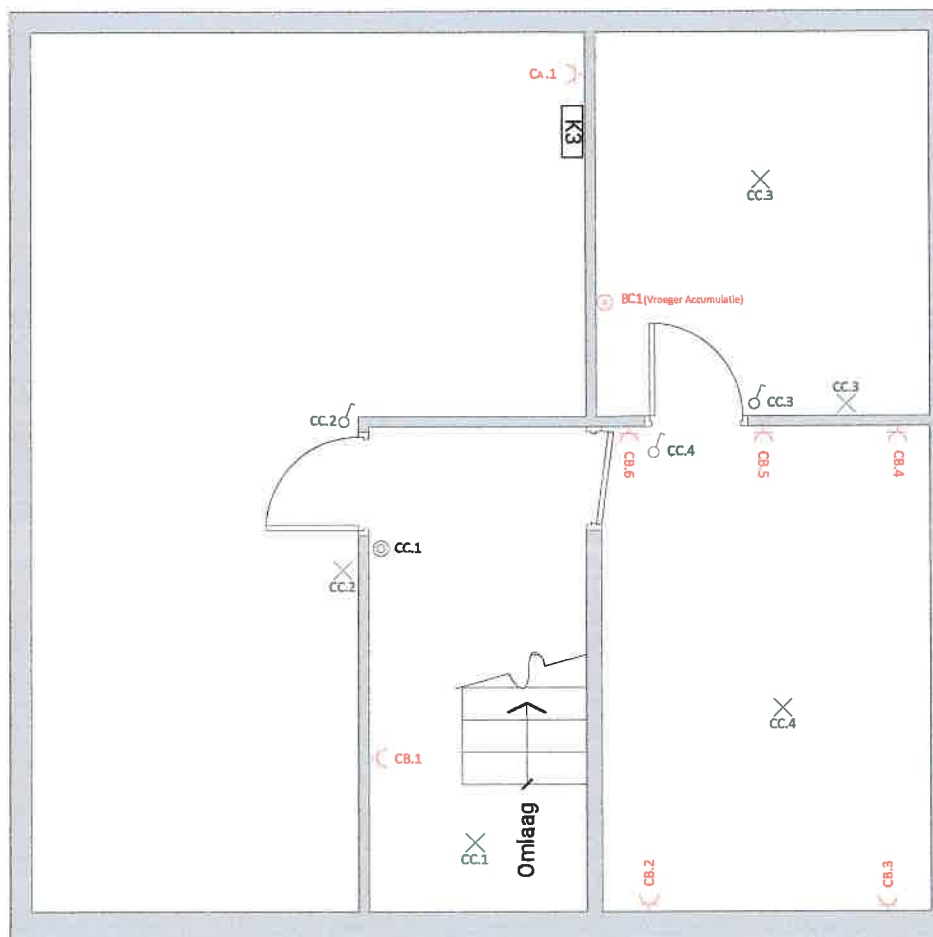

Bouwheer/Installateur Naam Installateur: Dries Vander Meulen – DomiTel Engelstraat 23, 8540 Deerlijk BTW nr: BE-0507.917.734 Datum: .../.../2020	Handtekening:	Goedkeuringsorganisme Naam: Goedkeuring: Datum: .../.../2020	Handtekening:	Bouwheer Naam Installateur: Amaert Bert Brugsesteenweg 31 8531 Hulste Datum: .../.../2020	Handtekening:
---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

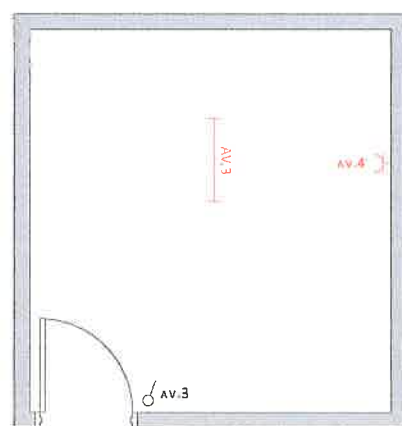

Zekeringkast - NIEUWE nummering

K1

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	2P / 10A	2P / 10A	2P / 20A	2P / 10A	K9
A	B	C	D	E	F	G	H	AS	AT	AU	AV	I

2P / 20A	2P / 20A	2P / 16A	2P / 16A	2P / 16A	2P / 16A	2P / 16A	3P / 20A
AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR

2P / 16A	2P / 16A	2P / 16A	2P / 16A	2P / 16A	2P / 16A	2P / 16A	3P / 20A
AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ


Differentieel/ Verlesstroom	Differentieel/ Verlesstroom	2P / 20A	2P / 20A				K10
4P/40A/300mA	4P/63A/30mA 5	AA	AB				

K2

2P / 20A	Teller T1	2P / 16A	Teller T2	3P / 20A	K11 Vraagier voor Accumulatie voeding zolder BC.1
BA		BB		BC	

K3

					2P / 20A	2P / 16A	2P / 10A
					CA	CB	CC

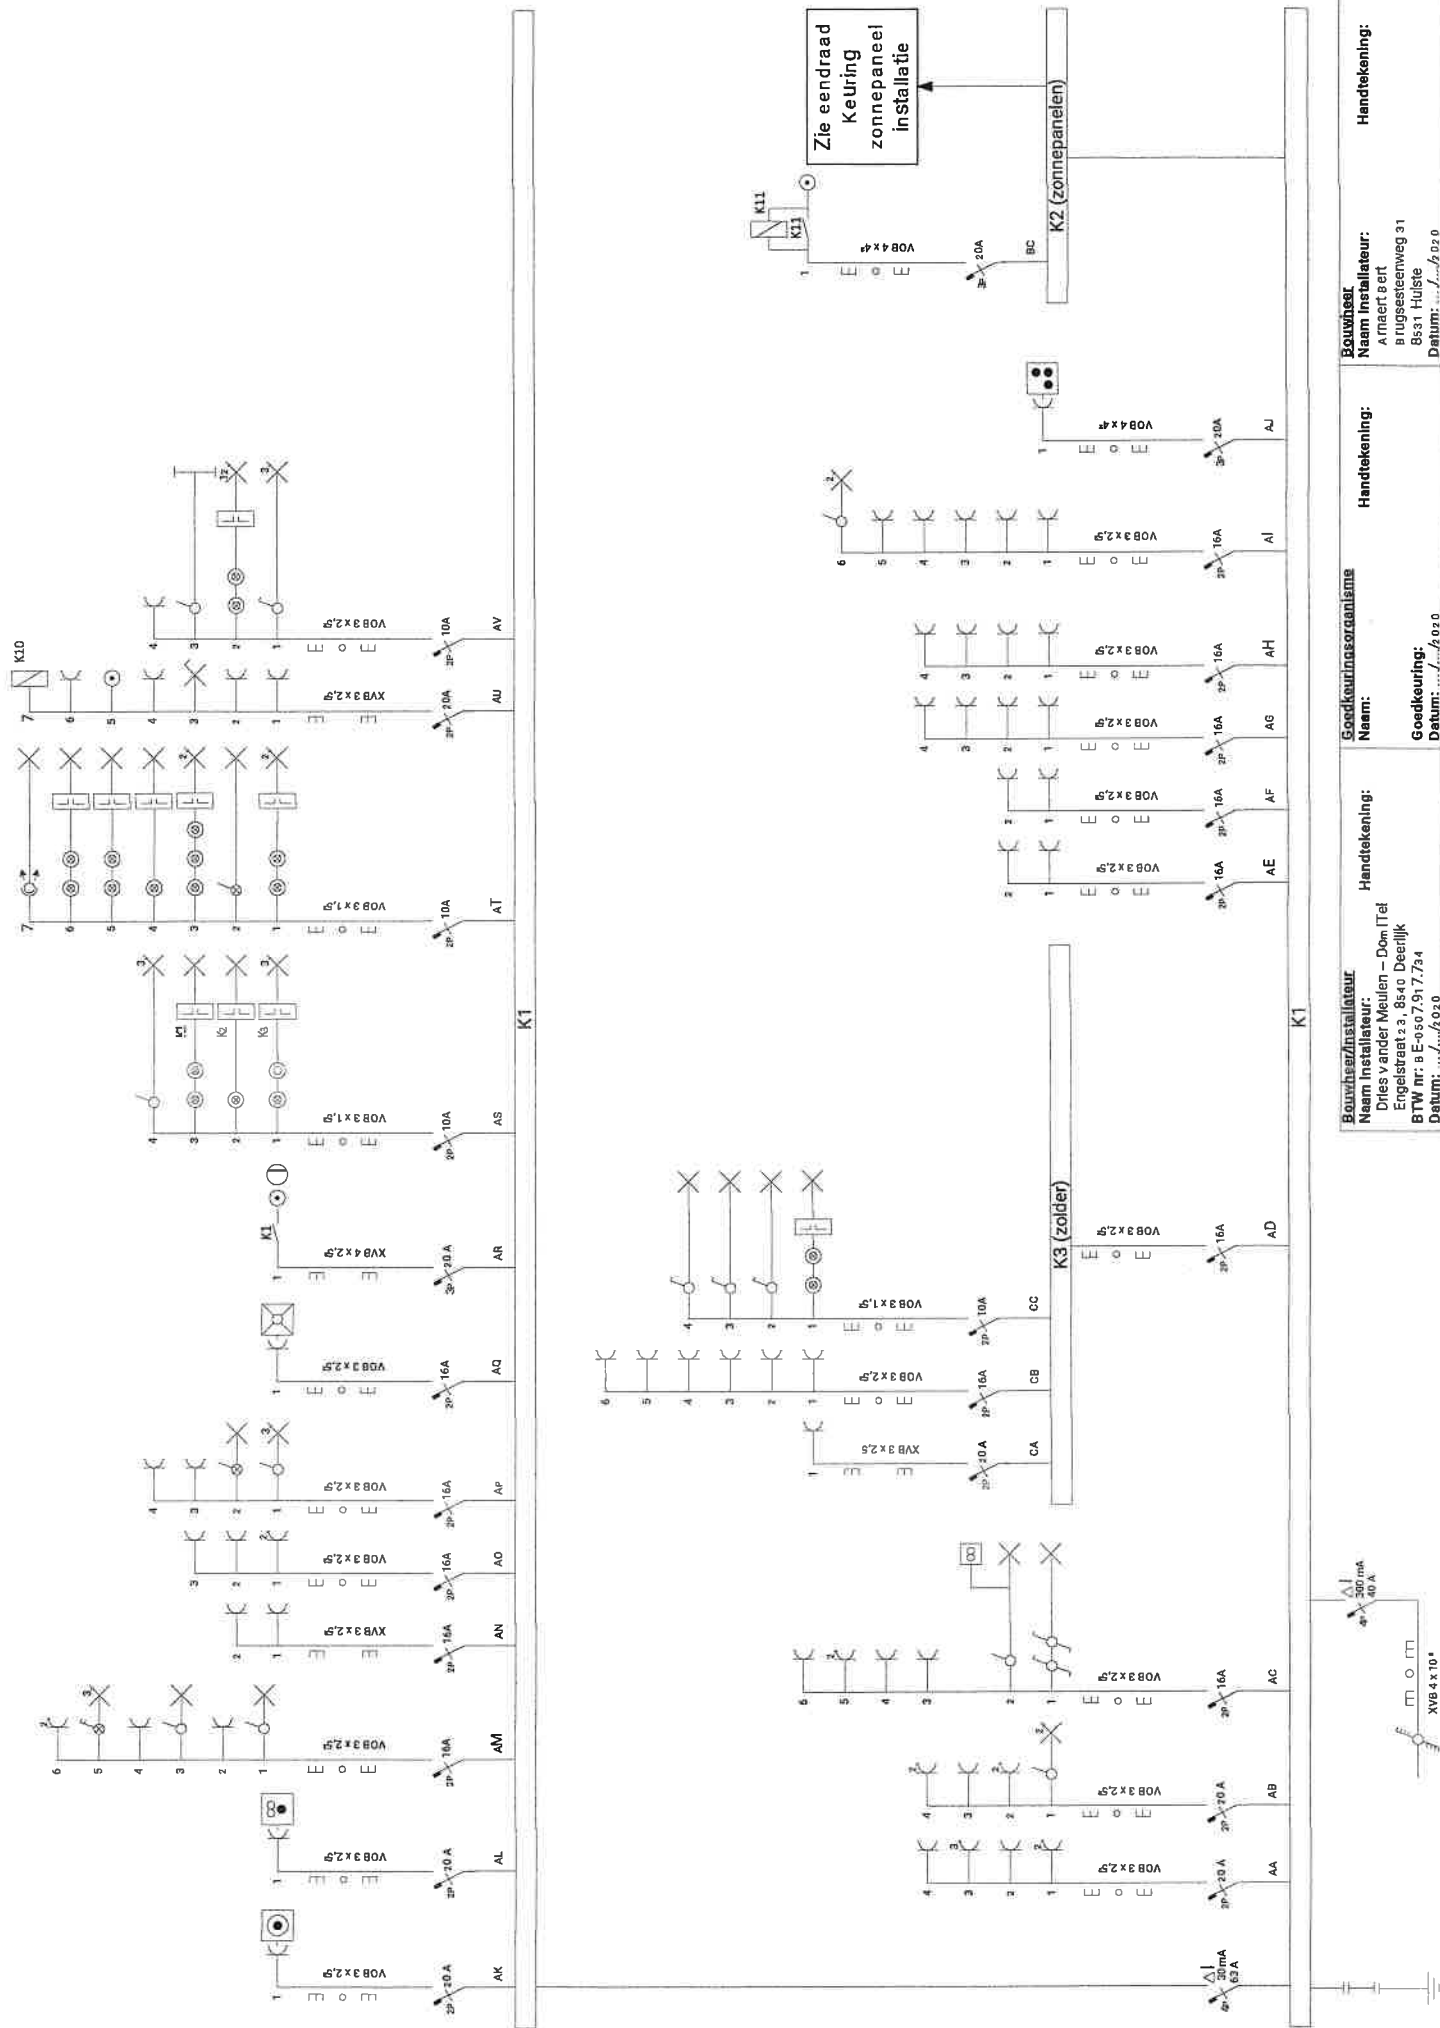

Bouwheer/Installateur: Naam Installateur: A maert 8 art Brugsesteenweg 31 8531 Hulste Datum: .../.../2020	Handtekening:	Handtekening:	Handtekening: Naam: Goedgekeuringsorganisatie: Datum: .../.../2020
---	----------------------	----------------------	--

Bouwheer/Installateur: Naam Installateur: Dries vander Meulen - Dom Tiel Engelstraat 23, 8540 Deerlijk BTW nr: 8 E-6507917.734 Datum: .../.../2020	Handtekening:	Handtekening:
--	----------------------	----------------------
