

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	275/2022/1/19/6	Datum van bezoek: Date de visite:	19/01/2022
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	JVO-PROJECTS Kievietstraat 23 - 9800 DEINZE BTW BE 0897.189.127	IK: CI:	
Distributie beheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	GEEN TELLER GEPLAATST EAN-nr: N° EAN: 54144886002049984
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Nederzwijnaarde 73 - 9052 ZWIJNAARDE		
Eigenaar: Propriétaire:	/		
Installateur:	BVBA JVO PROJECTS	BTW/TVA:	897189127
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUIS1 (Conformiteitscontrole van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. 11h: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname nieuwe installatie (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage nouvelle installation (6.4)

Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison	73K
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
≥230V	4 x 10 mm ² VOB	40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:
3.44 Ohm	Isolatie / Isolément:	1
	9.42 MOhm	Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise:
		15
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	AC
40A	30mA	AC
Eindstroombanen / terminaux		
8		
7		
Test Δ In		
1. Δ In		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
Aansluitingen: Raccordements:	OK	OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
		OK
		Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:
		NVT

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.
De PV-installatie behoort niet tot deze controle.
Zolderverdieping niet afgewerkt.
De definitieve verlichtingen zijn nog te plaatsen.
Geen keuken en badkamer geplaatst/afgewerkt.

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 19/01/2047
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroomrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 19/01/2047
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

Geert Dick

Algemene inlichtingen / renseignements généraux

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
 2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
 3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
 4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
 5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
 6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
 7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:


1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
 2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
 3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
 4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
 5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
 6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
 7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

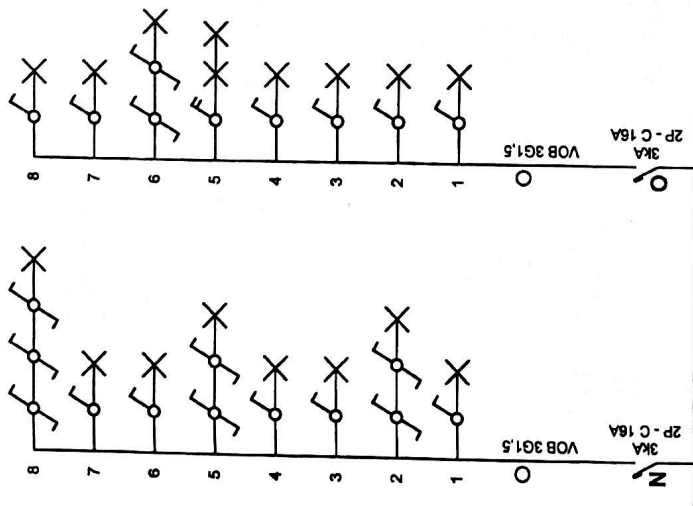


Plaats van de elektrische installatie
plan en bouw
nedrerswijnhaarde lot11 73 Bus K
9052 zwijnhaarde

Installateur
BVBA JVO-Projects
Klevetstraat 23
9800 Deinze
GSM: 0476 42 36 41
e-mail: info@jvo-projects.be
BTW BE 0897.189.127

ELECTROTEST
GSM +32 0490 57 89 39
19/07/2012

p. 2/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

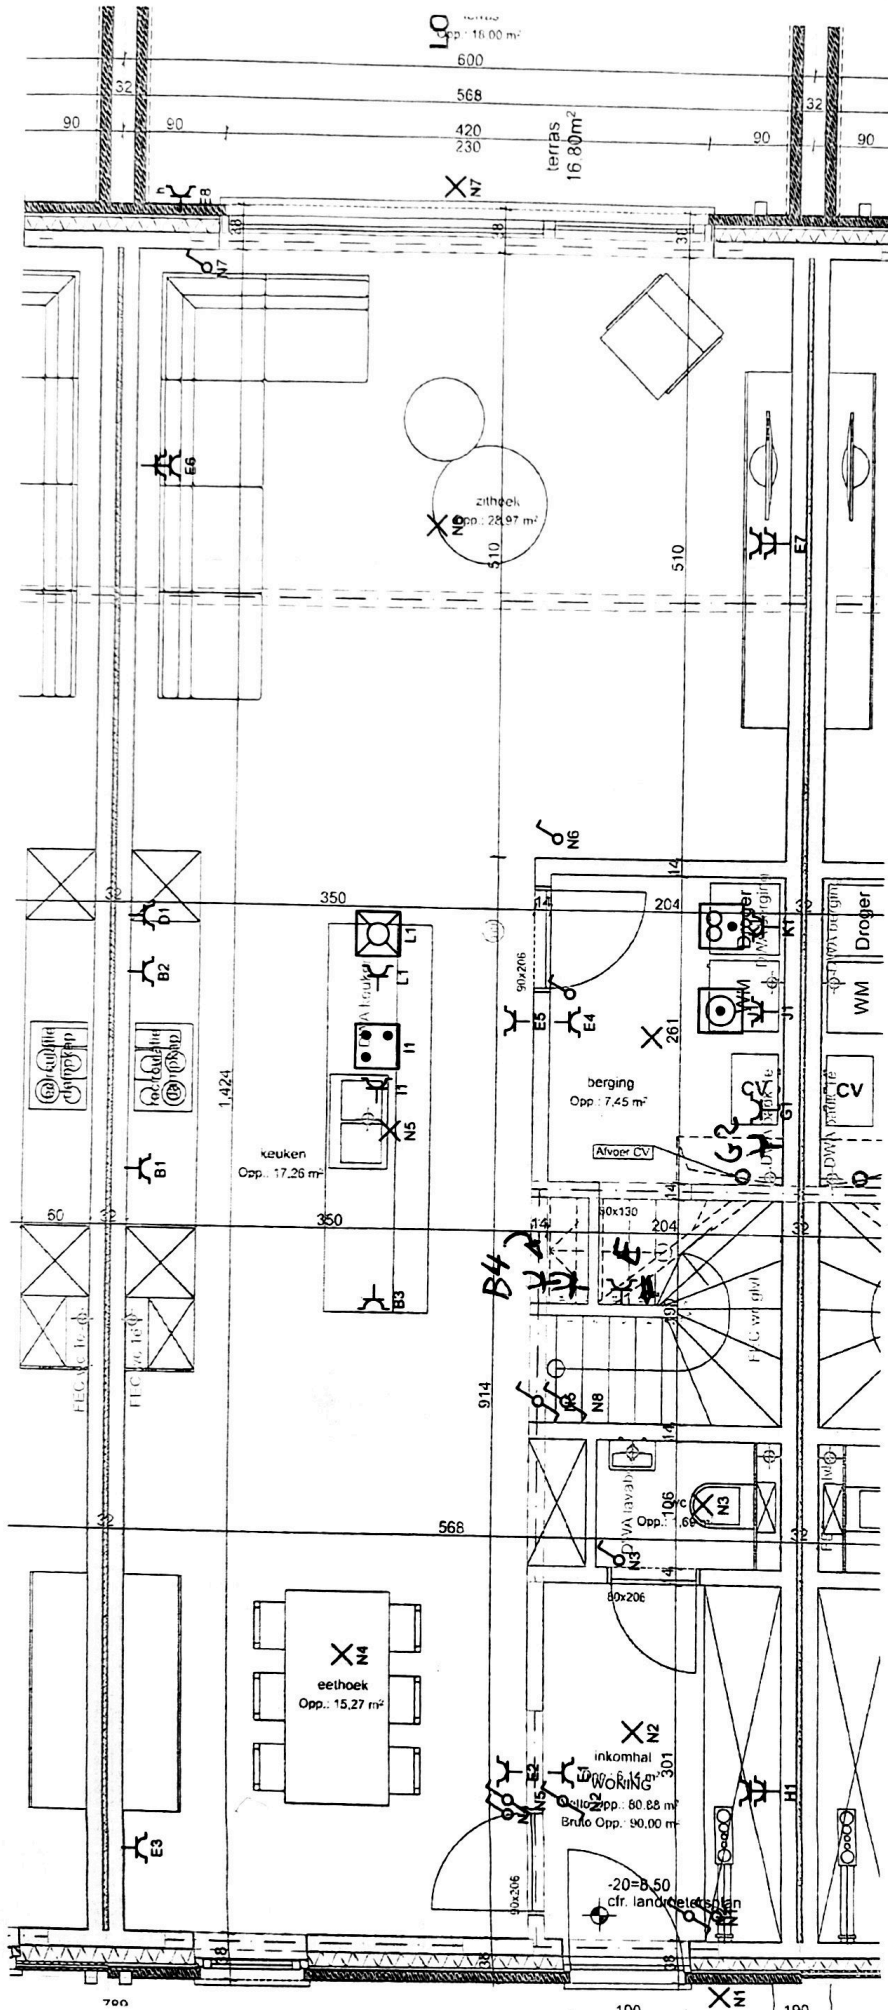



Plaats van de elektrische installatie
plan en bouw
nederzwinnaarde lot 11 73 Bus K
9052 zwijnaarde

p. 3/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
BVBA JVO-Projects
Kievitsraai 23
9800 Deinze
GSM: 0476 42 36 41
e-mail: info@jvo-projects.be
BTW BE 0897.189.127

ELECTROTEST
Geert-BICK
inspecteur
geest. 0476 42 36 41
GSM +32 (0)60 57 88 39


19/07/2022

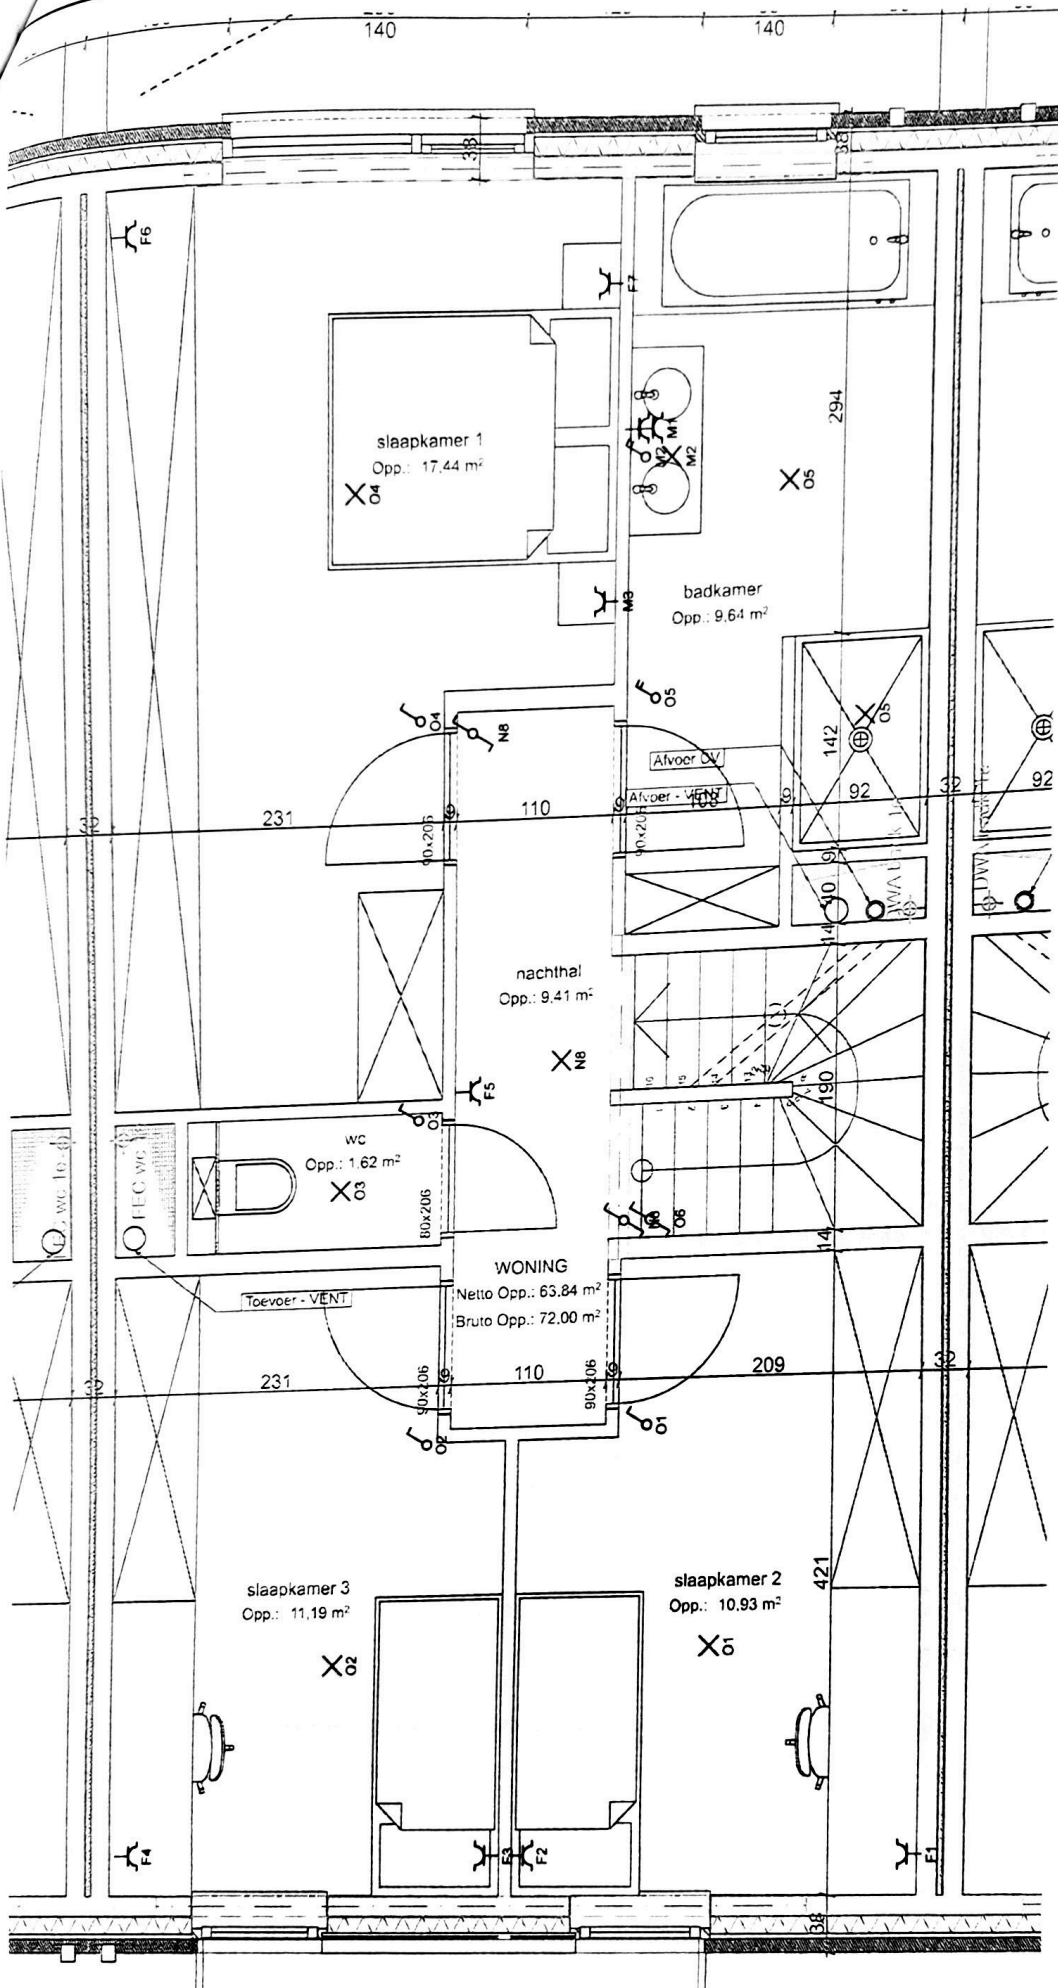

Plaats van de elektrische installatie
plan en bouw
nedrerswijnnaarde lot11 73 Bus K
9052 zwijnnaarde

Installateur
BVBA JVO-Projects
Kievelstraat 23
9800 Deinze
GSM: 0476 42 36 41
e-mail: info@jvo-projects.be
BTW BE 0897.189.127

p. 4/5
Situatieschema
2 x 230V ~ 50Hz

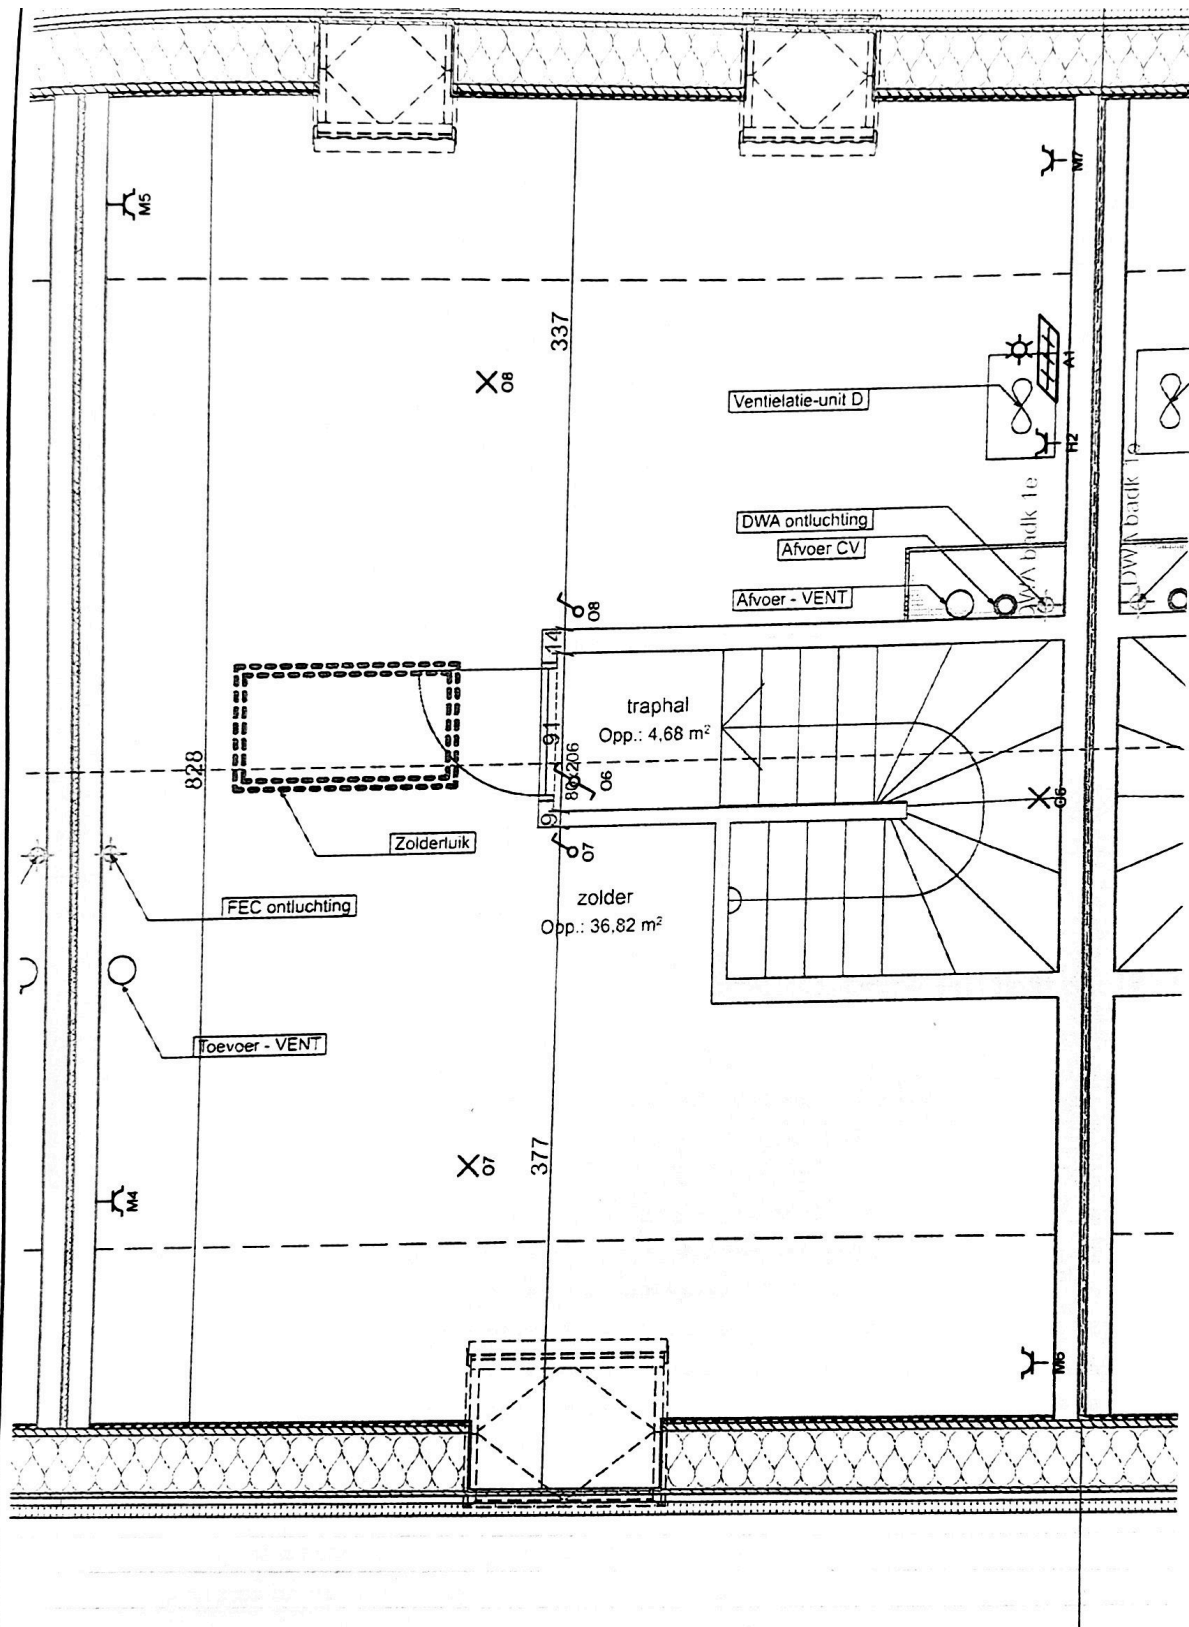

Plaats van de elektrische installatie
plan en bouw
nederrzwijsnaarde lot11 73 Bus K
9052 zwijnaarde

Installateur
BVBA JVO-Projects
Kievietstraat 23
9800 Deinze
GSM: 0476 42 36 41
e-mail: info@jvo-projects.be
BTW BE 0897.189.127

ELECTROTEST
7/18
118
GSM 432 4440 01 83 33

19/01/2021
