


Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Kerkakker 3B bus 3, 9270 Kalken
Naam eigenaar	Siau
Adres eigenaar	
Type object	appartement
EAN-code	niet beschikbaar
Aard installatie	nieuw
Doel onderzoek	in dienststelling

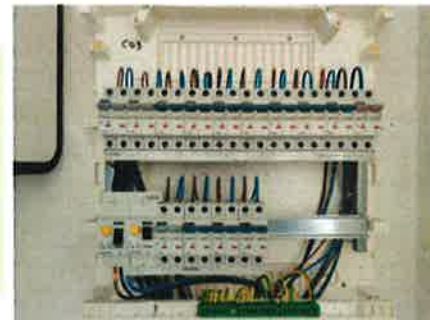

Het onderzoek is verricht op 30/04/2020 volgens artikel art 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230
Type elektrode	lus
Voedingsleiding (mm ²)	10
In hoofdbeveiliging (A)	max 40

In hoofdschakelaar (A)	40
ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Aantal verdeelborden	1
Aantal stroombanen per verdeelbord	14

Metingen

Ra / Zs (Ω)	1,3 / –
Continuïteitsmeting	goed

Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien er tijdens de keuring geen schema's aanwezig waren is het mogelijk dat er bepaalde delen van de installatie niet werden vastgesteld.

Opmerkingen

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's
De verlichtingsarmaturen waren tijdens de controle niet aangebracht.

Besluit

De installatie is conform het AREI.
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 30/4/2045, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 30/4/2020

Naam agentonderzoeker: Thomas Neirynek

Handtekening:



Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

VOB st 10mm

Plaats van de elektrische installatie


Dhr. Siau
Kerkaker 3B Bus 3
9270 Kaiken

Installateur

GSM: 0477 05 85 23
e-mail: lode.eiz@outlook.be
BTW BE 0638.832.595

p. 1/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz



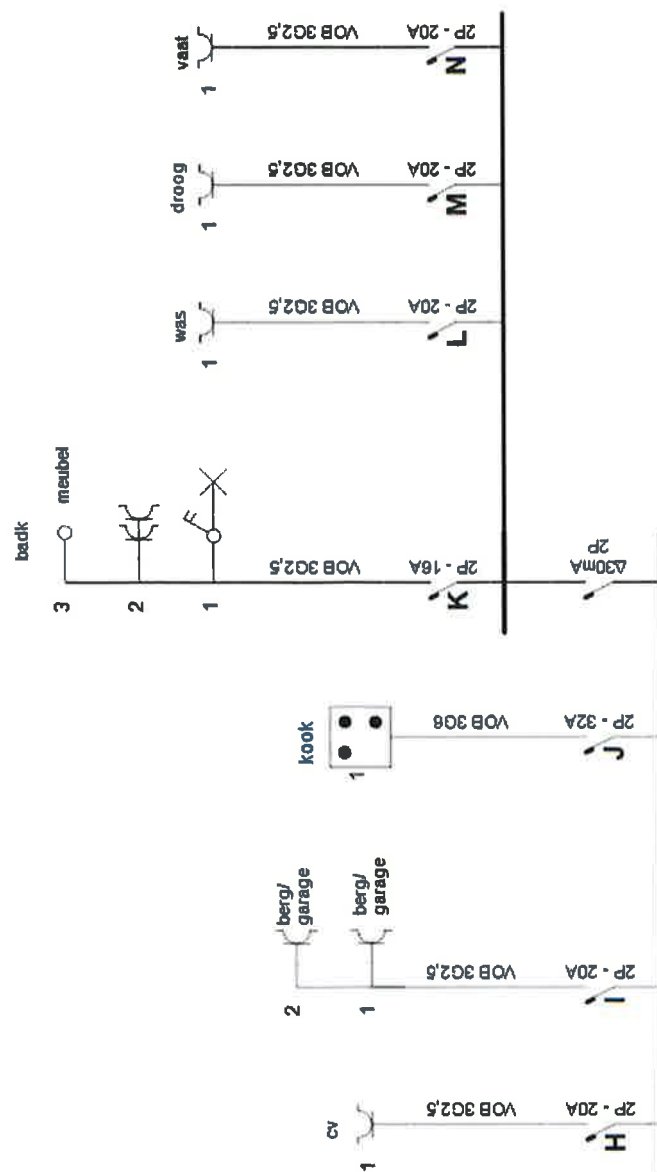

Plaats van de elektrische installatie
Dhr. Siau
Kerkakker 3B Bus 3
9270 Kalen

Installateur
Elektrische Installaties Zottegem bvba
Rijkestraat 54
9620 Strijpen
GSM: 0477 05 85 23
e-mail: iode.eiz@outlook.be
BTW BE 0638.832.595



p. 2/3
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz
