ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 25/10/2024 **Inspecteur:** Peter D'Hooge **Mentor:** **Installateur:** Electro Debeerst
ID-label: 1/2 **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:BE 0533 637 877

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251252

Datum verslag: 25/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Baanstknokstraat
Huisnummer	1
Busnummer	2
Postcode	8790
Gemeente	Waregem
Land	België

Eigenaar

Naam	iov
Straatnaam	Baanstknokstraat
Huisnummer	1
Busnummer	2
Postcode	8790
Gemeente	Waregem
Land	België

Installateur

Naam	Electro Debeerst
BTW nr.	BE 0533 637 877
Telefoonnummer	+32 496 60 13 69
E-mail	info@electrodebeerst.be

Type : appartement **EAN** : 541 448 860 023 059 874 **Teller Nr.:** : 1SAG3200084809

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023? Nee


Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm^2 Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 16

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 2,44 MΩ

OK

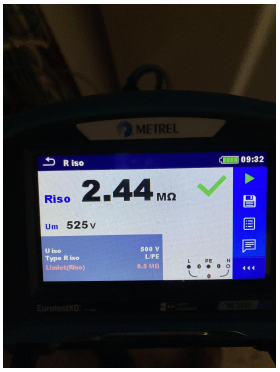

RE: 2,15 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
zie schema	-	-		-	-

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 25/10/2049

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 2

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:00 tot 12:45

De inspecteur Peter D'Hooge

De werknemer,

Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 25/10/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

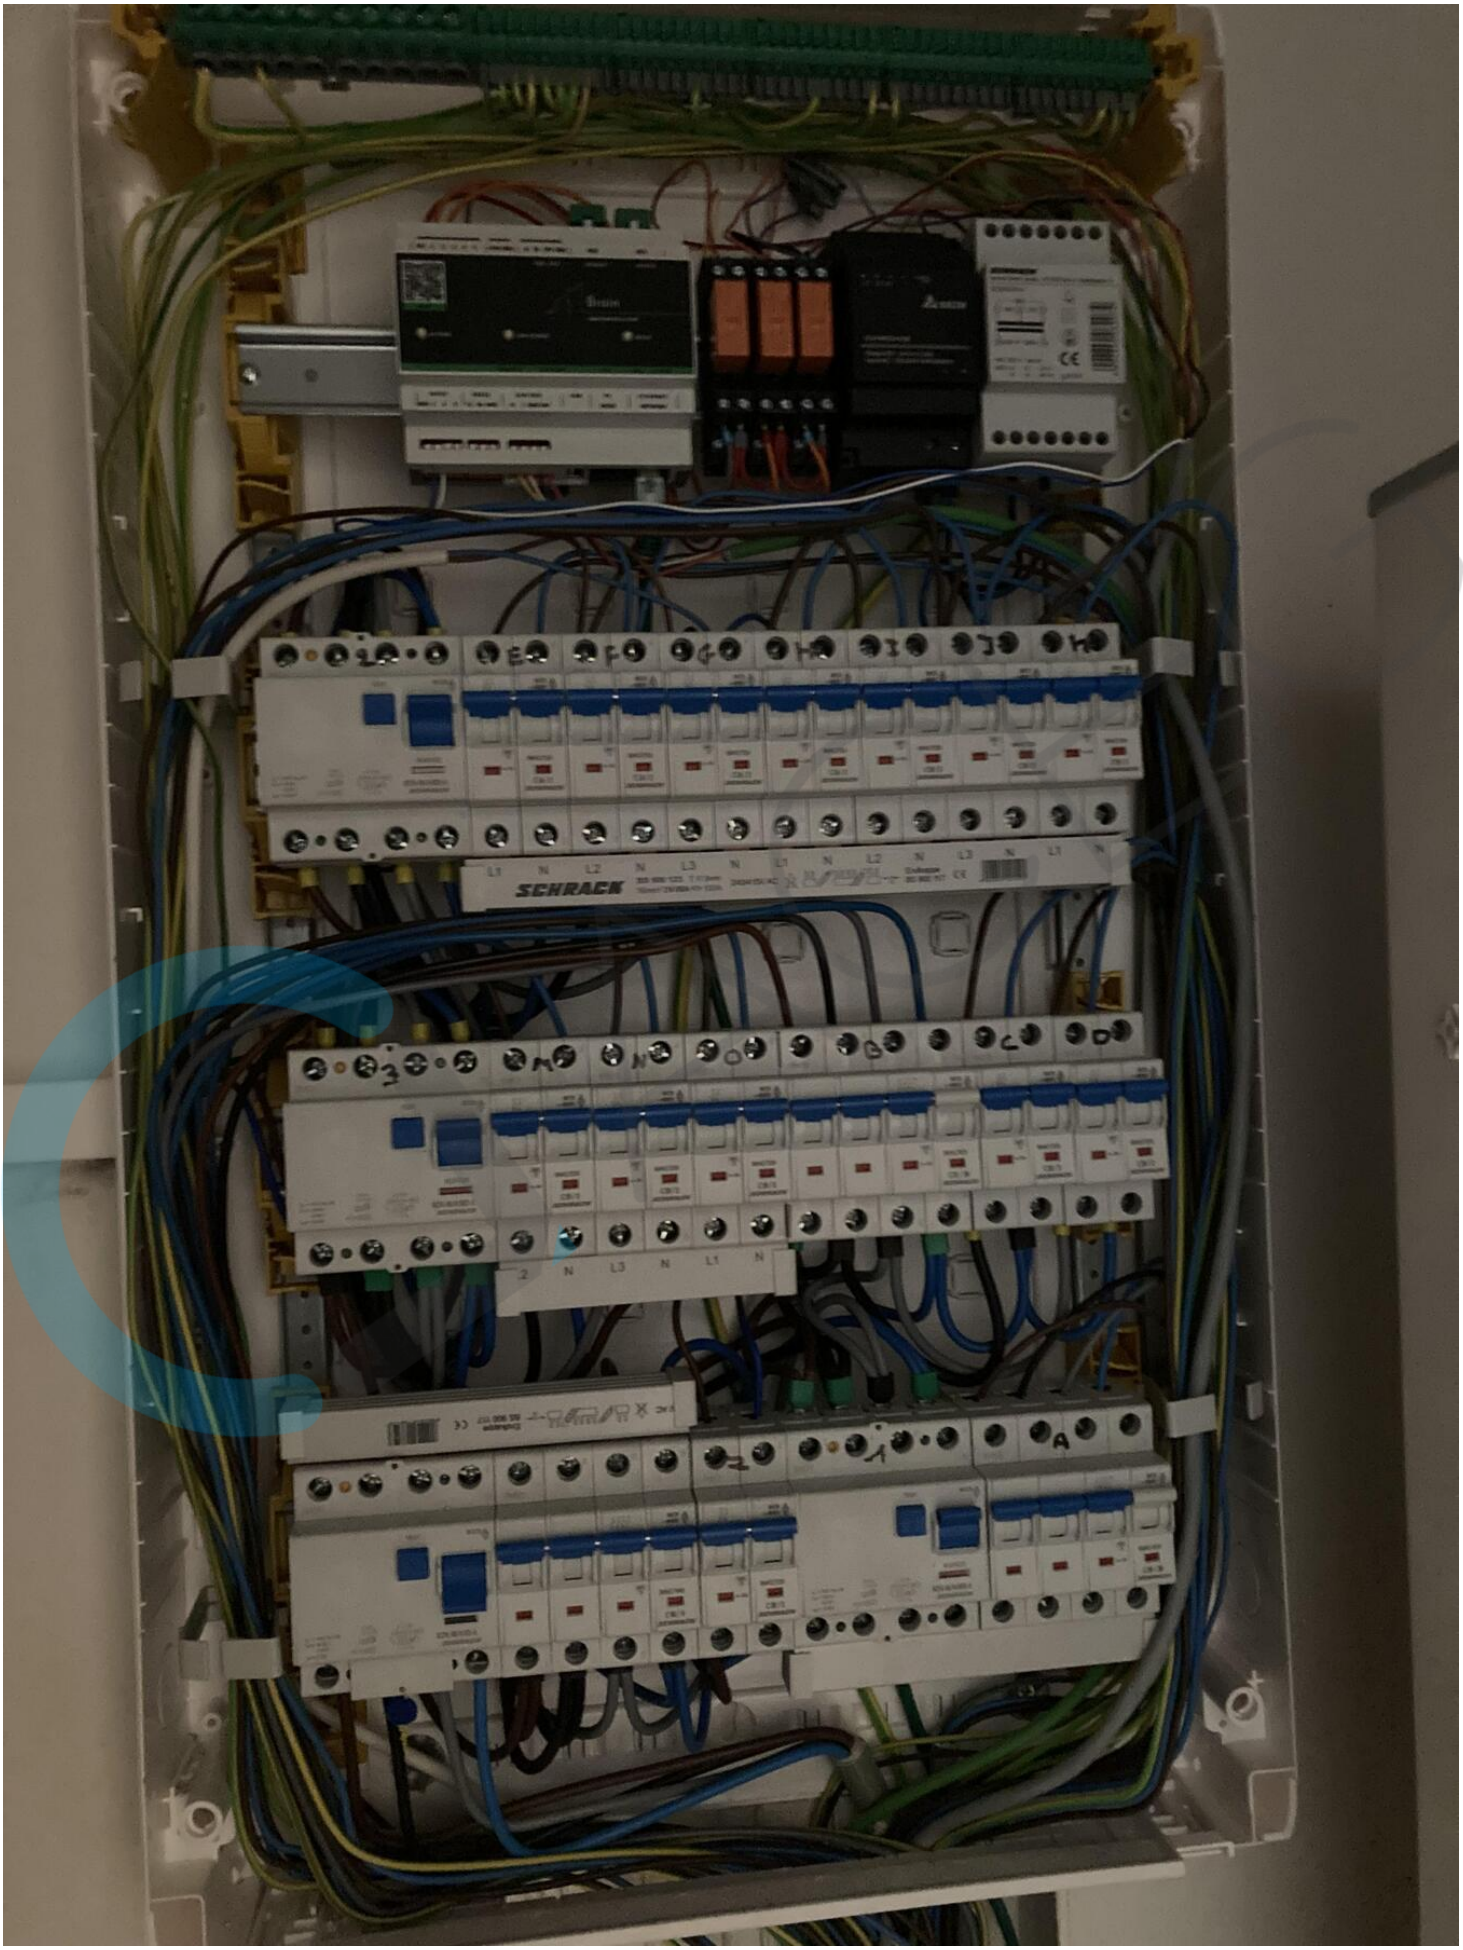
SCHRACK






METREL
Aarde
08:07
Ra 2.15 Ω
Rc 0.0 kΩ
Rp 0.0 kΩ
Limiet(Ra) 60 Ω
L PE N
EurotestXD
AUTO SEQUENCE
MI 3155


METREL
R iso
09:32
Riso 2.44 MΩ
Um 525 V
U iso 500 V
Type R iso L/PE
Limiet(Riso) 0.5 MΩ
L PE N
EurotestXD
AUTO SEQUENCE
MI 3155

Baanstknokstraat 1 bus 2
8790 Waregem

electro debeerst
Hoefijzerstraat 9
8790 Waregem
Ond Nr 0533 637 877
Tel 0496 60 13 69
www.electrodebeerst.be

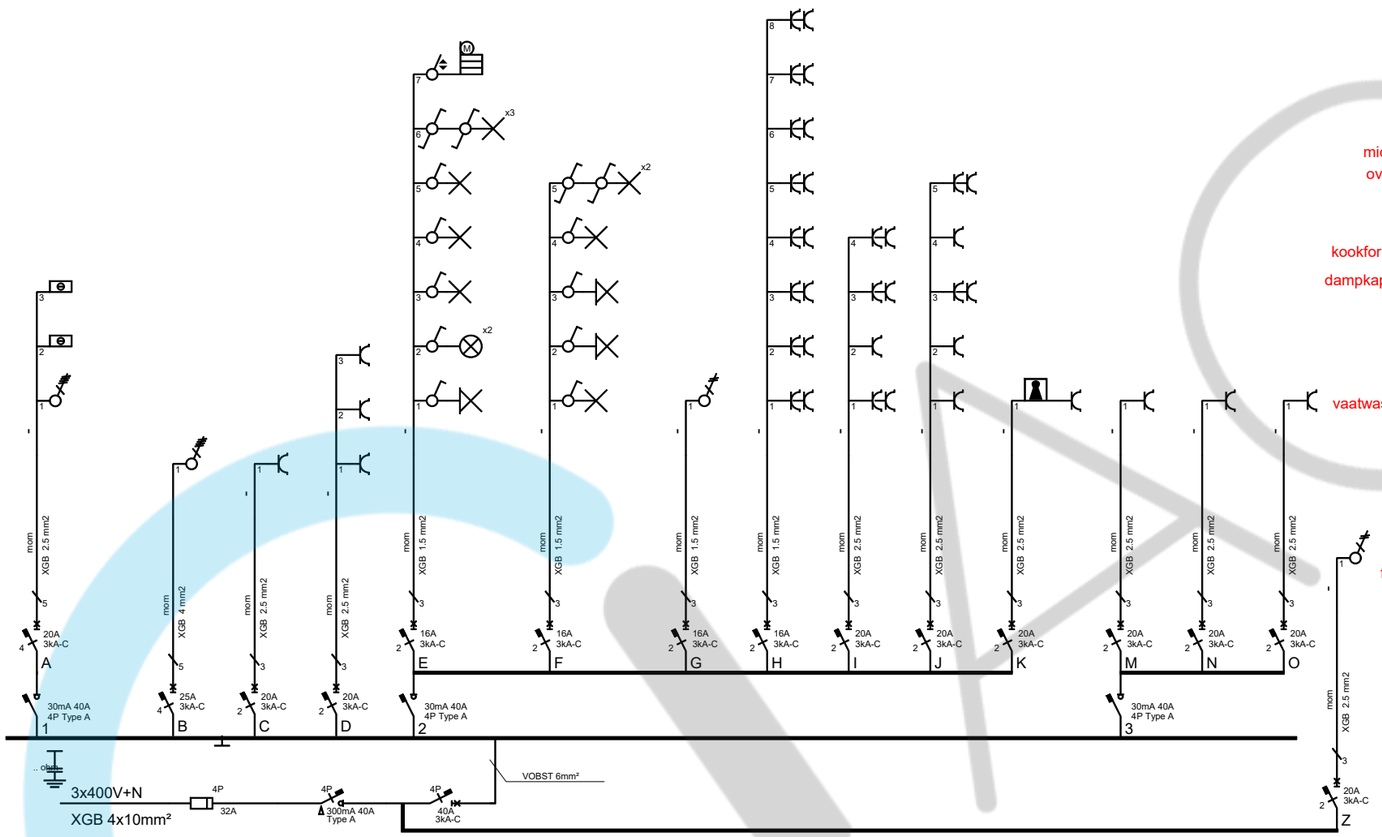

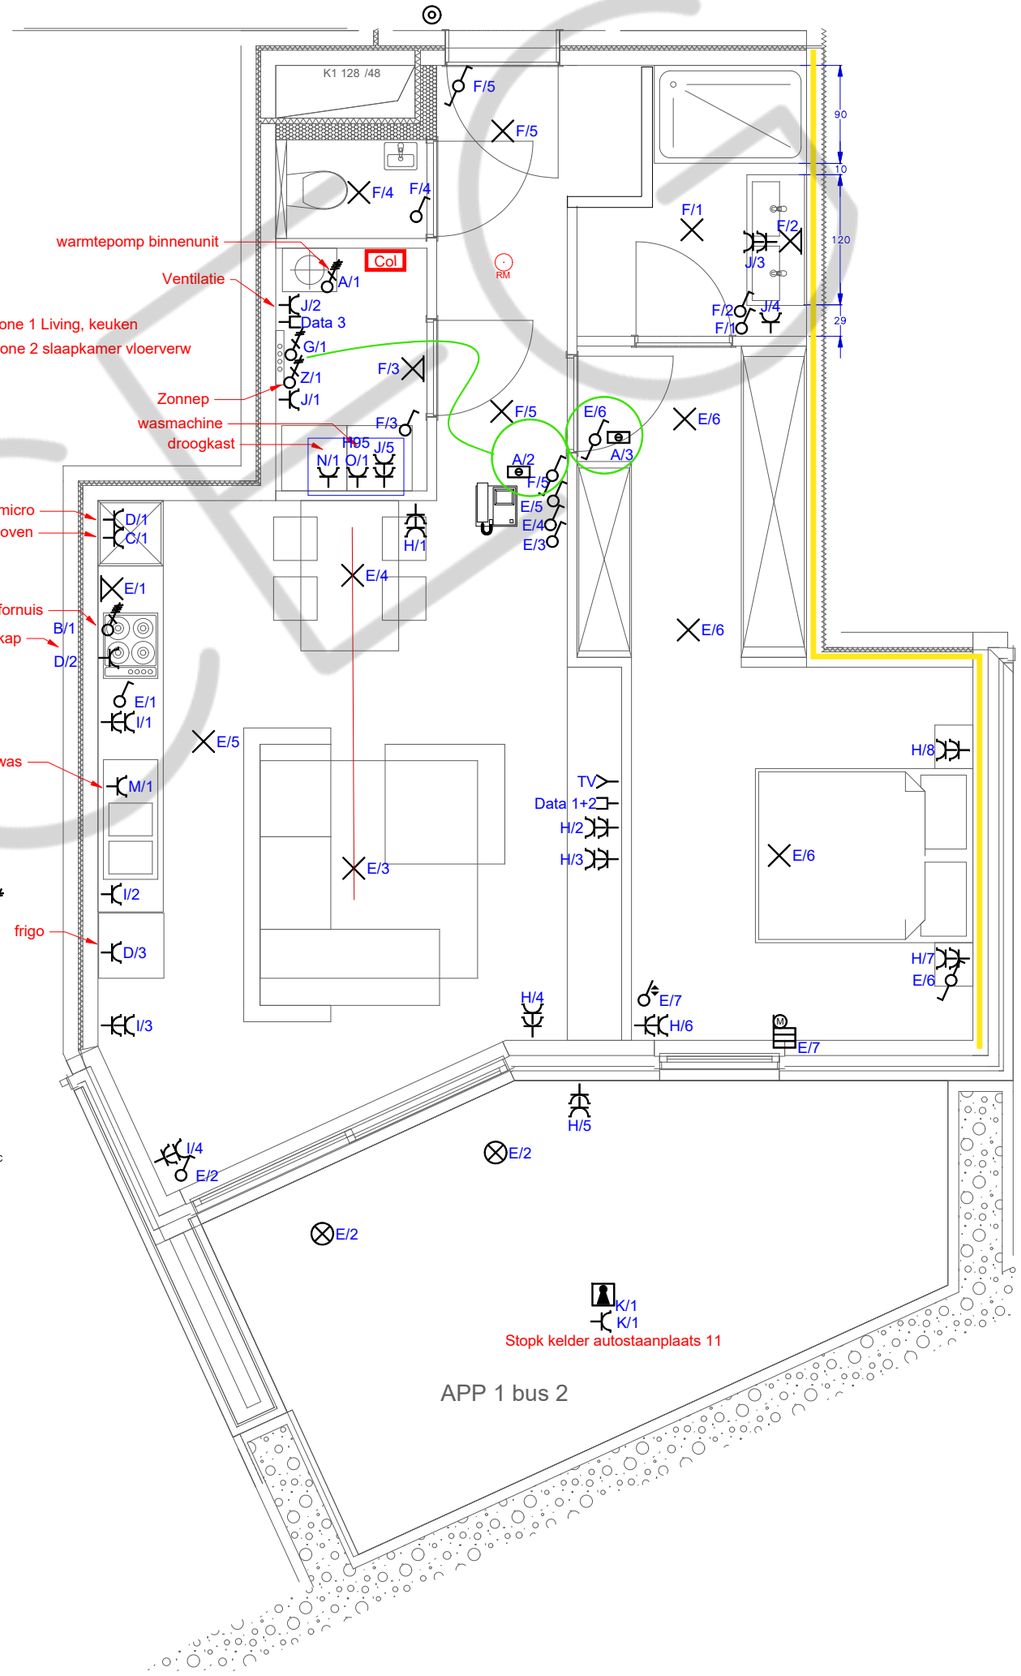

De werknemer,

Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

25/10/2024
